


D U R A T A (99)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Dura gp.
1	A	Allestimento cantiere, accatastamento vetri e infissi presso aula mensa al piano primo.	16/12/2021	19/12/2021	2
2	B	Rimozione serramenti e posa in opera di nuovi serramenti dell'aula mensa (SE08) e del corridoio (SE09 e SE10)	18/12/2021	22/12/2021	4
3	D	Rimozione serramenti e posa in opera di nuovi serramenti delle aule e del corridoio (SE11)	23/12/2021	04/01/2022	12
4	E	Rimozione cassonetti e avvolgibili e posa in opera nuovi serramenti - sgombero e pulizia aula mensa	04/01/2022	12/01/2022	8
5	F	Sgombero e pulizia cantiere	13/01/2022	14/01/2022	1

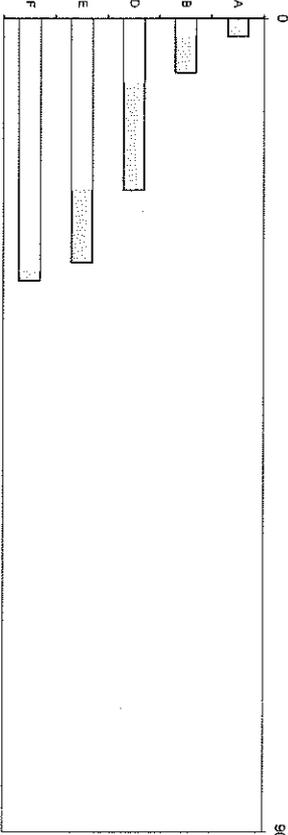

TC

27

99.

naturali consecutivi

Inizio dei lavori


0 99

Fine lavori

30 99

ANNOTAZIONI IMPORTANTI RELATIVE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO:

- Inizio lavorazioni: giorno 16/12/2021 dopo le 14:30, a seguito dello sgombero degli alunni dell'aula mensa;
- 16/12/2021: Recupero chiavi della porta ubicata al piano primo della scuola oggetto del lavoro;
- 16/12/2021: Inizio stoccaggio di tutto il materiale presso l'aula mensa ubicata al piano primo, a tal fine i lavoratori saranno accompagnati da personale scolastico che si assicurerà che non ci siano persone e/o impedimenti al trasporto, al fine di poter lavorare in massima sicurezza;
- Dal 18/12/2021 al 22/12/2021: inizio rimozione e posa infissi SE08 (aula mensa) e SE09, SE10 (corridoio), in quanto nelle aule sono presenti gli studenti e dunque non accessibili alle lavorazioni;
- Si ricorda il personale scolastico che il giorno 21/12/2021 non potrà essere utilizzata l'aula mensa;
- Dal 23/12/2021 al 04/01/2022: Sarà possibile effettuare le lavorazioni nelle aule e l'intesso rimanente nel corridoio. Le aule saranno libere, tuttavia la scuola rimarrà aperta e personale scolastico potrà essere a disposizione;
- Dal 04/01/2021 al 12/01/2022: Rimozione cassonetti e posa nuovi serramenti. A tal fine si fa presente che il giorno 10/01/2022 bisognerà provvedere allo sgombero e la pulizia dell'aula mensa, in quanto il giorno 11/01/2022 dovrà essere utilizzata dagli studenti;



Il Direttore dei Lavori
Arch. Stefano Secchi

L'Impresa
S.A.L. di Uccieddu Federico
